


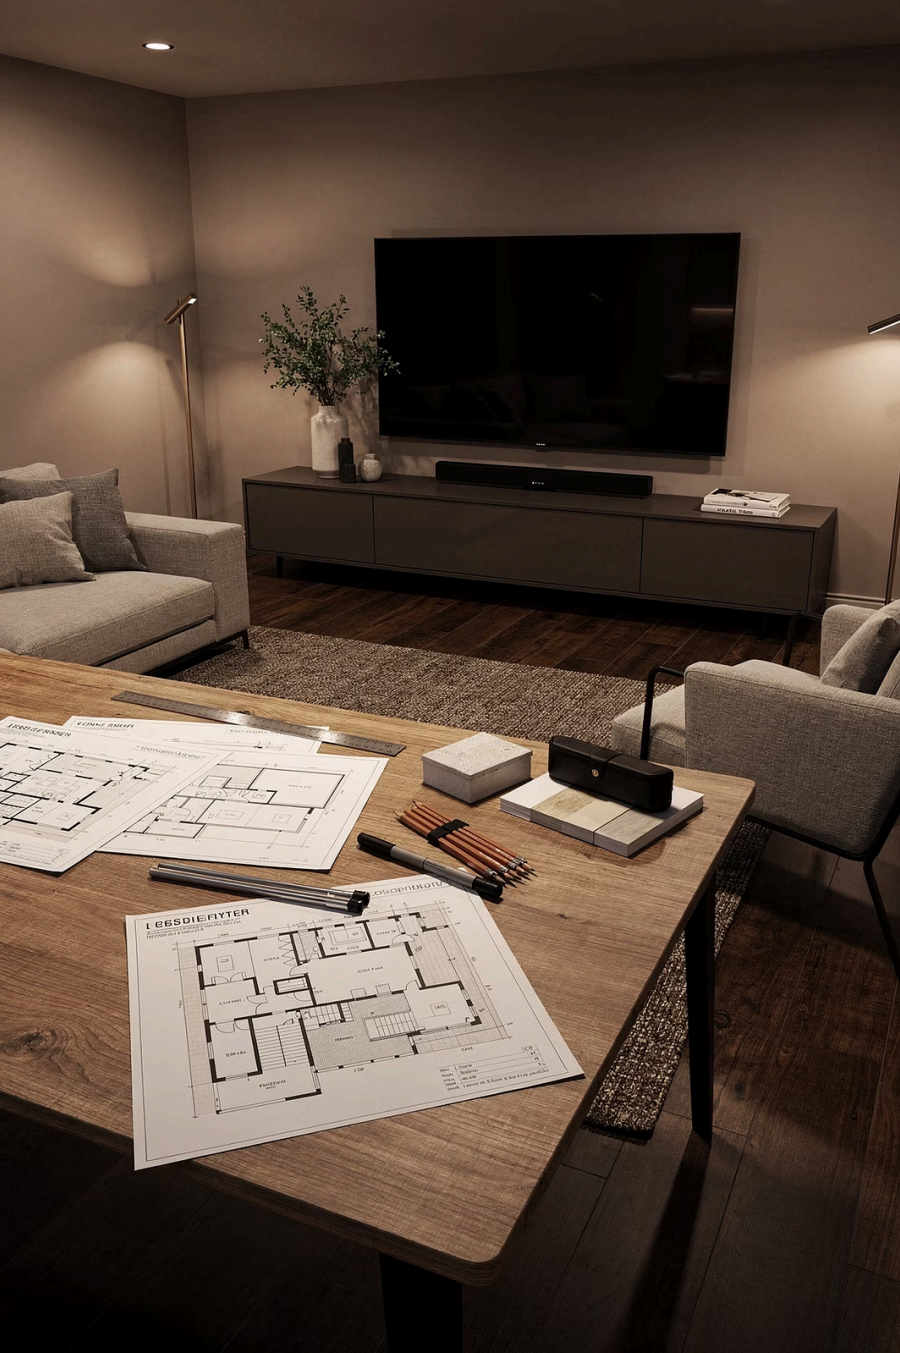

PDF 5 - CRONOGRAMA OFICIAL - SALA

O passo a passo da execução: saiba exatamente o que acontece em cada etapa e quando contratar cada profissional.

 Material complementar – uso opcional

Antes de Começar

O cronograma de uma sala exige sincronia fina. Como é o ambiente com mais pontos de iluminação e marcenaria de destaque (painéis de TV), qualquer erro na ordem das etapas pode gerar retrabalho caro e atrasos em cascata.

Controle Diário do Tempo

O controle diário do tempo acontece no **Painel de Controle – Aba 4_Cronograma 3P**.

Use Este PDF

Use este PDF para entender a lógica das etapas antes de cobrar o seu prestador.



O Que Fazer em Cada Semana

Cronograma estimado com as quatro semanas de execução da obra da sala.

1

Semana 1

Infraestrutura e "Obra Bruta"

2

Semana 2

Preparação e Base

3

Semana 3

Revestimentos e Medição Crítica

4

Semana 4

Montagem e Estética

Semana 1 & 2: Infraestrutura, Preparação e Base

Semana 1 — Obra Bruta

- **Demolição e Elétrica:** Quebra de paredes (integração) e novos pontos de tomada/dados para o rack.
- **Climatização:** Passagem da infraestrutura do ar-condicionado (tubulação e dreno).
- **Gesso:** Início do rebaixo, cortineiros e sancas de iluminação.

Semana 2 — Preparação e Base

- **Iluminação:** Furação do gesso para spots, trilhos e rasgos de luz.
- **Pintura Base:** Emassamento e primeira demão de pintura (teto e paredes).
- **Piso:** Regularização do contrapiso ou preparação para piso sobre piso.



Semana 3 & 4: Revestimentos, Medição Crítica, Montagem e Estética

Semana 3 — Revestimentos e Medição Crítica

- **Piso e Rodapés:** Instalação do porcelanato ou vinílico.
- **Medição Final da Marcenaria:** **Ouro:** O marceneiro só mede após o piso e o gesso estarem prontos.
- **Proteção:** Proteção total do piso com Salva-Piso antes da entrada de móveis pesados.

Semana 4 — Montagem e Estética

- **Marcenaria:** Montagem dos painéis de TV, buffets e cristaleiras.
- **Finalização Elétrica:** Instalação de luminárias, pendentess e automação.
- **Retoques:** Papel de parede, espelhos e última demão de pintura.





Checklist de Controle do Cronograma

Use este checklist para garantir que uma etapa não atropele a outra:

1

Prumo da Parede

A parede do painel de TV está perfeitamente reta para receber a marcenaria?

2

Teste de Carga

O gesso foi reforçado nos pontos onde haverá pendentos pesados ou trilhos?

3

Dreno Testado

O dreno do ar-condicionado foi testado com água antes de fechar o gesso?

4

Passagem de Cabos

Os cabos de HDMI e rede já estão passados dentro do conduíte antes de fechar o painel?

5

Limpeza Fina

A sala foi limpa antes da instalação de cortinas e sofás?



Quando Comprar Cada Item?

Semana 1

Materiais de construção, fios, gesso e infra de ar-condicionado.

Semana 3

Piso, rodapés e revestimentos de parede (pedras/ripados).

1

2

3

4

Semana 2

Luminárias, spots, fitas de LED e tintas.

Semana 4

Sofá, mesa de jantar, cortinas e itens de decoração.



Como Usar Este Cronograma do Jeito Certo



✓ Alinhe com o Gesseiro e Eletricista

Eles são os primeiros a entrar e definem o ritmo da obra.



✓ Use a Aba 4_Cronograma 3P do seu Painel


Registre as datas reais e monitore atrasos no seu Painel de Controle.



✗ Não instale o sofá antes da pintura acabar

O pó do gesso e respingos de tinta são fatais para tecidos.

Diagrama do Fluxo de Execução

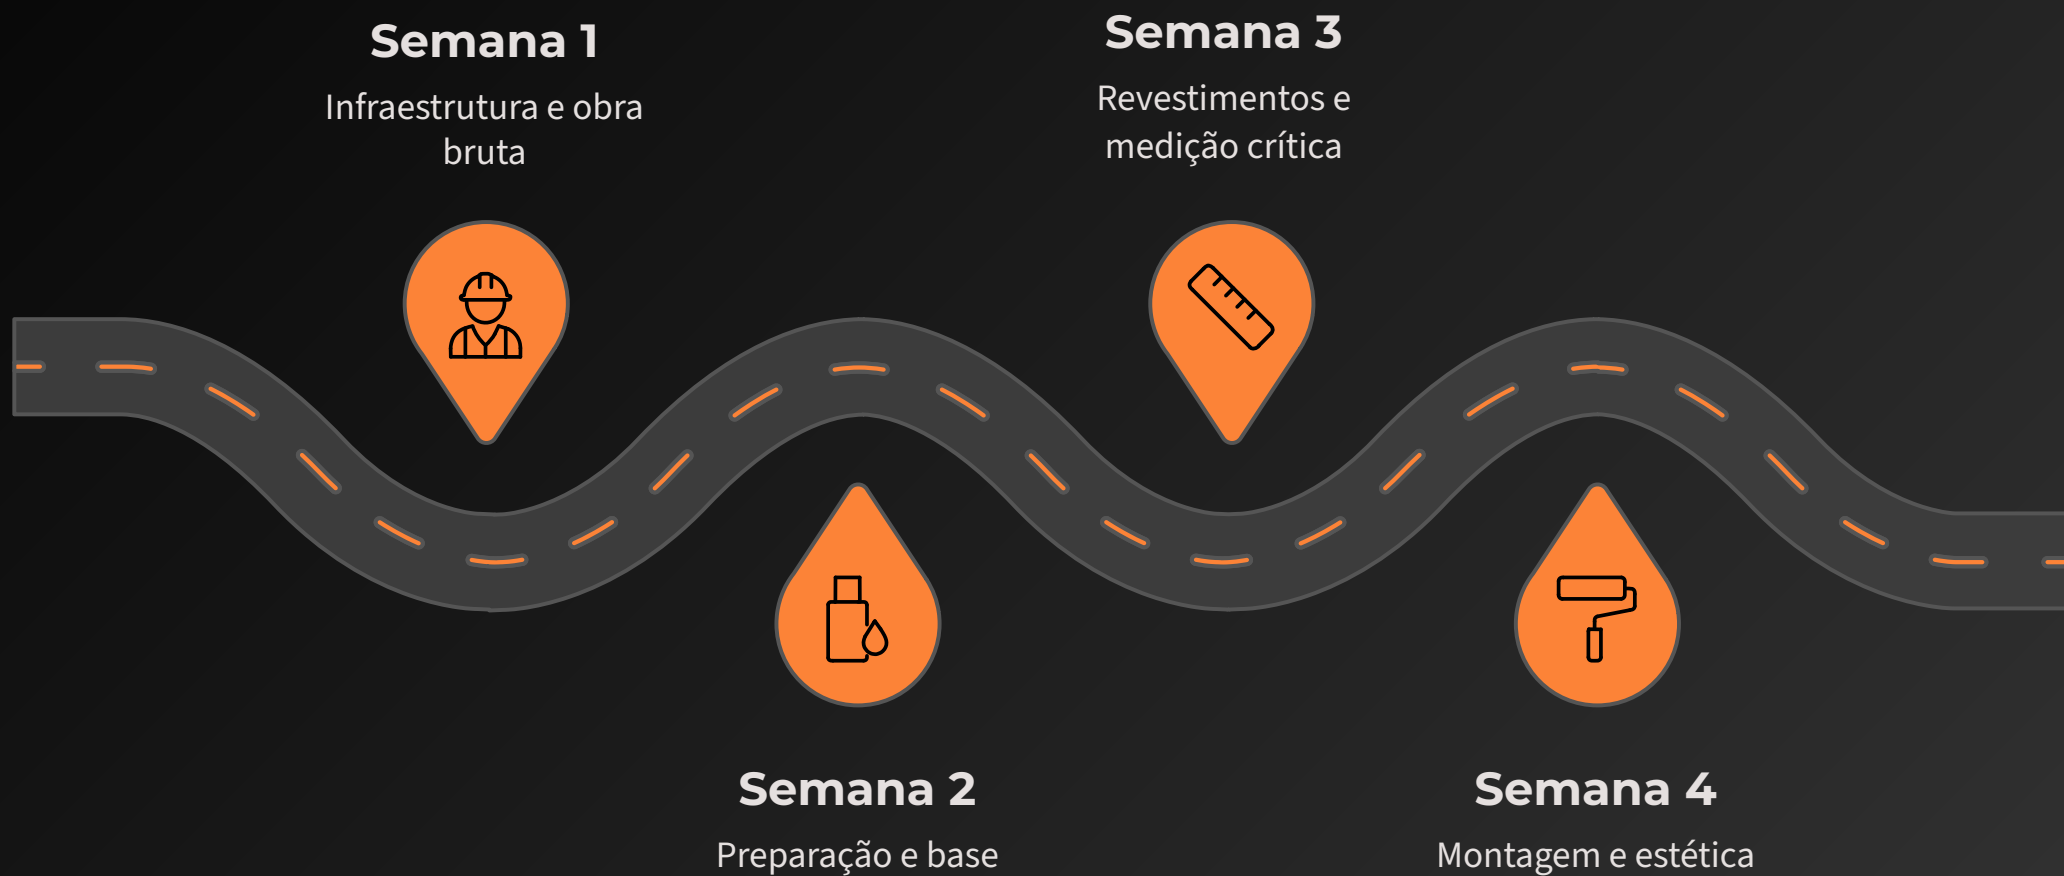

Seguir este fluxo garante que cada profissional entre no momento certo, evitando retrabalho e atrasos em cascata.



Conclusão

Uma sala executada na ordem certa economiza tempo e evita que você pague diárias extras de profissionais parados. Siga o fluxo e mantenha o controle no seu Painel.



Painel de Controle

Use a **Aba 4_Cronograma 3P** para registrar datas reais e monitorar cada etapa.



Siga o Fluxo

Cada semana tem sua função. Respeitar a ordem é a chave para uma obra sem surpresas.



Checklist Sempre

Valide cada ponto crítico antes de avançar para a próxima etapa da execução.



© 2024 MÉTODO 3P – SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE REFORMAS. Todos os direitos reservados. Este conteúdo, incluindo a lógica do Painel de Controle e os guias técnicos, é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e Propriedade Intelectual. A reprodução, revenda ou compartilhamento não autorizado constitui crime e será objeto de medidas judiciais cabíveis.
