



PDF 5 — CRONOGRAMA OFICIAL DO QUARTO

O passo a passo da execução: saiba exatamente o que acontece em cada etapa e quando contratar cada profissional. *(Material complementar – uso opcional)*

Antes de começar

O cronograma de um quarto parece simples, mas o segredo está na sincronia entre a obra "suja" e a marcenaria. Este guia serve para você não deixar a obra parada e, principalmente, para não danificar os materiais caros de acabamento.



👍 O controle diário do tempo acontece na **Planilha 3P – Aba Cronograma**.

👍 Use este PDF para entender a lógica das etapas antes de cobrar o seu prestador.



O QUE FAZER EM CADA SEMANA

(CRONOGRAMA ESTIMADO)

1

SEMANA 1

Infraestrutura e "Sujeira"

2

SEMANA 2

Preparação e Base

3

SEMANA 3

Acabamentos de Piso e Medição

4

SEMANA 4

Montagem e Finalização



CHECKLIST DE CONTROLE DO CRONOGRAMA

Use este checklist para garantir que uma etapa não atrole a outra.



QUANDO COMPRAR CADA ITEM?

Planeje as compras alinhadas com cada semana de execução.



COMO USAR ESTE CRONOGRAMA DO JEITO CERTO

Entenda a lógica das etapas para cobrar cada prestador no momento certo.

✓ CONCLUSÃO

Um quarto bem planejado é montado como um quebra-cabeça. A ordem correta protege o seu investimento e evita o retrabalho. Siga o fluxo e mantenha o controle.





SEMANA 1: Infraestrutura e "Sujeira"

1 Quebra de paredes e tomadas

Quebra de paredes (se houver) e novos pontos de tomada.

2 Infraestrutura do ar-condicionado

Passagem da infraestrutura do ar-condicionado (tubulação e dreno).

3 Início do gesso

Início do gesso (rebaixo e sancas).

4 Furação do gesso

Furação do gesso para iluminação.

SEMANA 2 e 3: Preparação, Base e Piso

Emassamento e pintura

Emassamento e primeira demão de pintura (teto e paredes).

Regularização do contrapiso

Regularização do contrapiso (nível zero para o piso novo).

Instalação do piso e rodapés

Instalação do piso (Laminado ou Vinílico) e rodapés.

Medição Final da Marcenaria

O marceneiro deve medir com o piso pronto.

Proteção total do piso

Proteção total do piso com papelão ondulado ou Salva-Piso.



SEMANA 4: Montagem e Finalização

Móveis Planejados

Montagem dos móveis planejados (etapa mais demorada).

Instalações e Acabamentos

- Instalação de luminárias, tomadas e espelhos.
- Papel de parede e retoques finais de pintura.



CHECKLIST DE CONTROLE DO CRONOGRAMA

Use este checklist para garantir que uma etapa não atropele a outra.

1

Liberação Elétrica

As tomadas da cabeceira estão na posição exata antes do gesso fechar?

2

Teste do Ar

O dreno do ar-condicionado foi testado para garantir que não vai vazar no gesso?

3

Piso Protegido

O piso foi instalado e devidamente protegido antes da marcenaria entrar?

4

Medição Real

O marceneiro mediu o quarto após o piso e o gesso estarem prontos? (Evita frestas).


5

Limpeza Pós-Obra

O quarto foi limpo antes da instalação do papel de parede e cortinas?



QUANDO COMPRAR CADA ITEM?

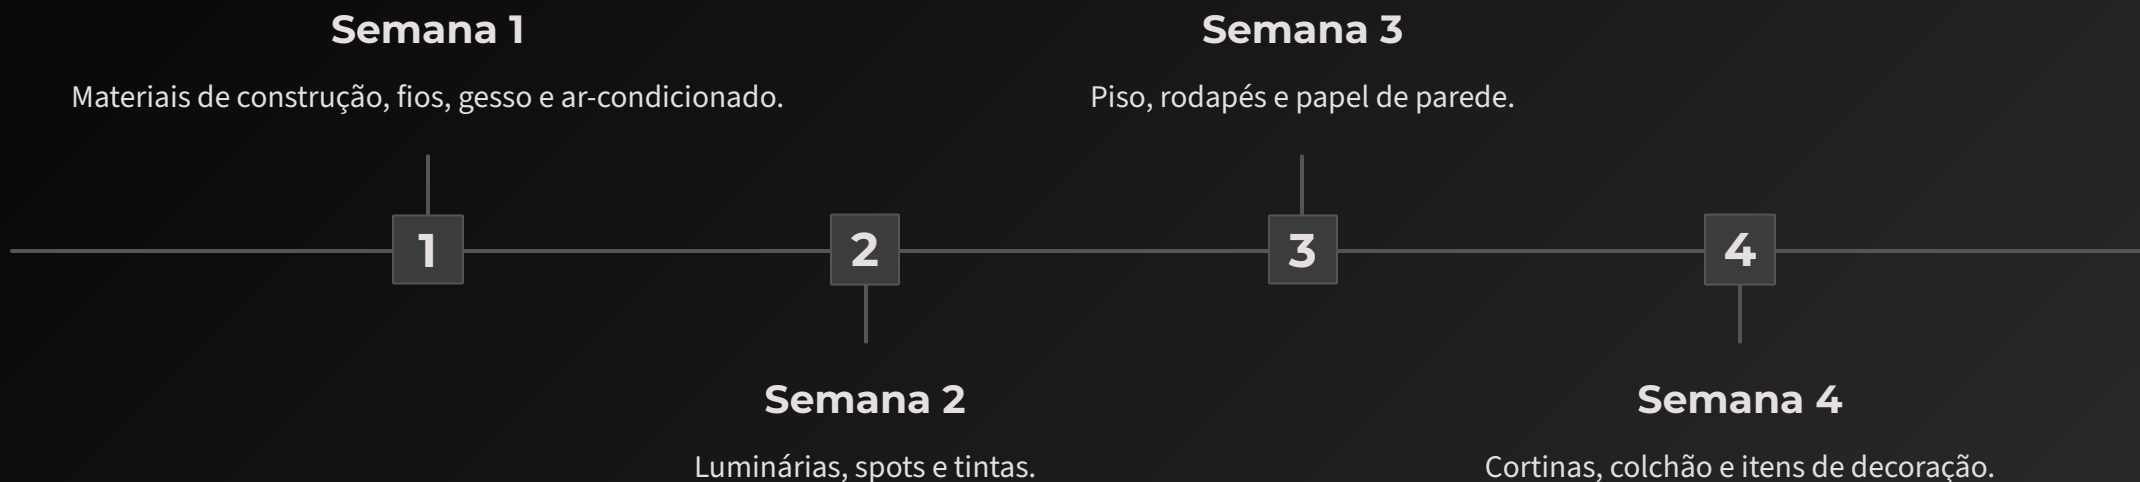

COMO USAR ESTE CRONOGRAMA DO JEITO CERTO

- ☒ Alinhe as datas com o seu marceneiro; ele é o **"dono" do prazo final do quarto.**
- ☒ Use a **Aba Cronograma da Planilha 3P** para registrar as datas reais.
- ☒ **Não instale a marcenaria com a pintura ainda úmida;** o mofo aparecerá em semanas.

