



PDF 4 - CADERNO DE PLANEJAMENTO - SALA

O guia prático para preencher seu Painel de Controle e ativar o controle total da sua reforma.
(Material complementar – uso opcional)



Antes de começar

Este PDF é o seu "manual de instruções" para o Painel de Controle

Ele serve para garantir que você insira os dados certos nos lugares certos, ativando os alertas que vão proteger o seu bolso.

Aba 1 — Identificação da Obra

Tudo o que você faz agora acontece na **Aba 1 — IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**.

Não avance ainda

Não avance para as outras abas antes de concluir este caderno.

Passo 1

Identificação: Dando Nome ao Projeto

O primeiro passo é tirar a obra da cabeça e colocar no sistema.

Nome da Obra


Seja específico. Ex: *"Sala de Estar/Jantar"*, *"Home Cinema"* ou *"Sala Integrada"*.

Localização

Preencha o endereço completo. Isso é vital para o cálculo de fretes e logística de entrega de grandes volumes (como sofás e painéis de marcenaria).

O Motivo Real

Registre aquela frase que definimos no PDF 1. Ela será o seu lembrete de **"por que estou fazendo isso"** quando a obra estiver no meio da poeira.



Passo 2

Diagnóstico: Alimentando o Escudo

Pegue as anotações que você fez no **PDF 2 (Checklist Zero Erro)** e passe para o Painel.

Como preencher

Status: Selecione entre  OK,  ALERTA ou  TROCA OBRIGATÓRIA para cada item (Elétrica, Gesso, Piso, Automação, etc.).

Observações: Escreva de forma simples o que precisa ser feito.

- "Mudar ponto de TV para parede oposta"
- "Refazer dreno do ar-condicionado"

O que acontece

Se você marcar algo como "**Troca Obrigatória**", o seu Painel de Controle acenderá um **alerta vermelho** na hora.

Passo 3

Orçamento Blindado: O Seu Limite

Na sala, a marcenaria de painéis, o sofá e a iluminação podem consumir a maior parte do seu dinheiro. Sem um teto, você corre o risco de ter uma sala linda, mas sem o sofá para sentar.

01

Orçamento Disponível

Digite o valor total que você tem na conta para essa reforma.

02

Margem de Segurança

O Pannel reservará automaticamente **10% a 15%** para os imprevistos (como um reforço estrutural inesperado para pendentos pesados ou ajustes de elétrica).

03

Teto Máximo de Gastos

Este é o valor real que você pode gastar com materiais, móveis e mão de obra.

July 17 Passo 4

Cronograma Inicial: O Mapa do Tempo

Defina as expectativas antes de contratar.

1

Data de Início

Quando o primeiro profissional (geralmente o eletricista ou gesso) entra na unidade.

2


Prazo Estimado

Para uma sala completa com marcenaria e gesso, considere de **45 a 60 dias** (devido ao tempo de cura da pintura e fabricação dos móveis).

3

Monitoramento 3P

O Painel vai monitorar esse prazo. Se o status mudar para **"Atrasado"**, você saberá que precisa cobrar agilidade do fornecedor.

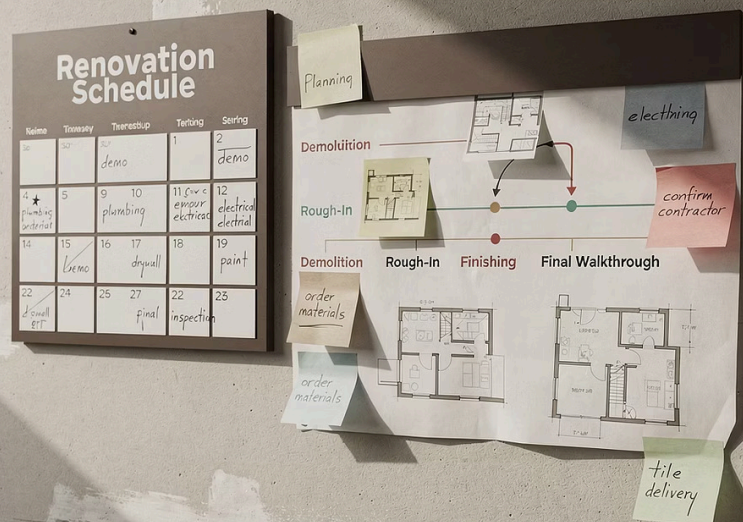

 Como Usar Este Caderno do Jeito Certo

Três Passos para Ativar o Seu Painel



Passo 1

Abra o Painel de Controle no seu computador ou celular.



Passo 2

Siga a sequência: Preencha de cima para baixo, sem pular etapas.



Passo 3

Confira o Painel: Após preencher tudo, vá na aba **PAINEL DE CONTROLE** e veja se o seu "cockpit" já está ativo.

Resumo do Caderno

Tudo que Você Preencheu na Aba 1

Seção	O que preencher	Por que importa
 Identificação	Nome, localização e motivo real da obra	Tira o projeto da cabeça e coloca no sistema
 Diagnóstico	Status de cada item (OK / Alerta / Troca)	Acende alertas vermelhos automáticos
 Orçamento	Valor total, margem de segurança e teto máximo	Protege seu bolso de gastos sem controle
 Cronograma	Data de início e prazo estimado (45–60 dias)	Monitora atrasos e cobra fornecedores

✓ Conclusão

Você Está no Comando

O Caderno de Planejamento é o que transforma um "**desejo de sala nova**" em um projeto executável.

Com esses dados inseridos, você não está mais à mercê da sorte; **você está no comando.**



Próximos Passos

Seu Painel de Controle Está Pronto para Trabalhar por Você



Escudo Ativado

Alertas vermelhos acendem automaticamente quando você marca itens como **Troca Obrigatória** no diagnóstico.



Orçamento Blindado

A margem de segurança de **10% a 15%** já está reservada para imprevistos. Você sabe exatamente quanto pode gastar.



Prazo Monitorado

O Painel monitora o cronograma e avisa quando algo está **"Atrasado"**, para que você cobre agilidade do fornecedor.



👉 Não avance para as outras abas antes de concluir este caderno. Preencha de cima para baixo, sem pular etapas.

